จังหวัดสมุทรสาคร
SAMUTSAKHON



รายงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

0 3442 5075

strategy.skn@gmail.com

http://www.samutsakhon.go.th

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)



1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 8 โครงการ 21 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 218,895,300 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้


1.1 สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ผลผลิต

ที่	ประเด็นการพัฒนา	โครงการ/ผลผลิต	งบประมาณ	สัดส่วน
1.	**ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :** พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**		
		1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	14,657,800	
		2. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1,397,500	
		รวมงบประมาณ	**16,055,300**	**7.33**
2.	**ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :** ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว และการบริการ สู่ตลาดสากล	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน**		
		1. โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	23,982,400	
		ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		
		1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	60,046,000	
		รวมงบประมาณ	**84,028,400**	**38.39**
3.	**ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :** พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**		
		1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	91,214,400	
		2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,778,800	
		3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย	12,940,000	
		4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน	5,857,400	
		รวมงบประมาณ	**117,790,600**	**53.81**

หมายเหตุ : มีงบประมาณที่ยังไม่ได้บริหาร จำนวน 1,021,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47

1.2 จำแนก...

1.2 สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

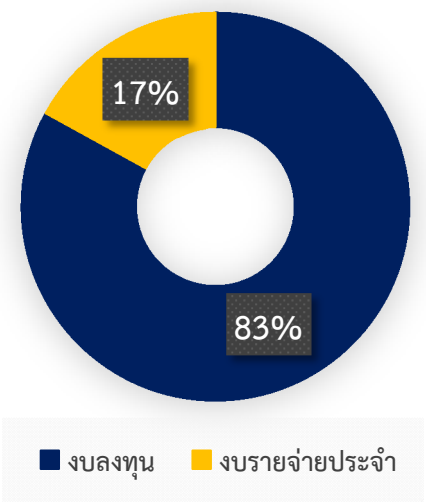

งบลงทุน 83%
181,687,200 บาท

งบรายจ่ายประจำ 17%
37,208,100 บาท

2. กลไกการกำกับติดตาม



1. คณะกรรมการจังหวัด
2. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สค.)
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.สค.)
4. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสาคร
6. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร

3. การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 คณะกรมการจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน










3.2 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สค.)

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ และการบริหารงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ








3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.สค.)

นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2








3.4 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กรณีส่วนราชการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ









3.5 คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความพร้อมพื้นที่ดำเนินโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ 3 อำเภอ









3.6 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเร่งรัดติดตามให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ








4. ผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ


4.1 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 65 ตามมติ ครม. 21 ธันวาคม 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 และการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 100.00 จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม (ร้อยละ)		ไตรมาส 1 (ร้อยละ)		ไตรมาส 2 (ร้อยละ)		ไตรมาส 3 (ร้อยละ)		ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93.00	100	30.00	34.08	21.00	22.16	21.00	25.50	21.00	18.26
งบลงทุน	75.00	100	13.00	28.96	16.00	29.19	17.00	23.50	29.00	18.35
งบรายจ่ายประจำ	98.00	100	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98	19.00	18.24

4.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด จากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

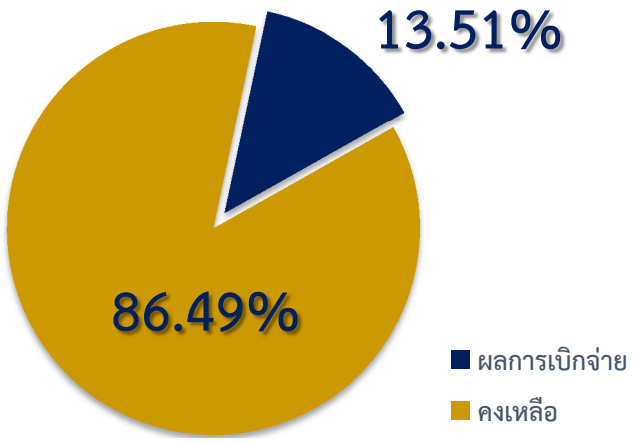

ภาพรวม

13.51%	63.22%
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ
29,563,216.19 บาท	138,381,336.66 บาท

งบลงทุน

11.76%	71.47%
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ
21,357,704.12 บาท	129,856,390.59 บาท

งบรายจ่ายประจำ

22.05%	22.91%
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ
8,205,512.07 บาท	8,524,946.07 บาท

เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 218,895,300 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

รายการ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	จำนวน (รายการ)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	
			แล้วเสร็จ	ก่อหนี้แล้ว/ กำลังดำเนินการ	ยังไม่ก่อหนี้/ ยังไม่อนุมัติโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
ภาพรวมทั้งหมด	**218,895,300.00**	**32**	**4**	**22**	**6**	**29,563,216.19**	**13.51**	**189,332,083.81**	**86.49**
งบลงทุน	181,687,200.00	18	1	13	4	21,357,704.12	11.76	**160,329,495.88**	**88.24**
งบรายจ่ายประจำ	37,208,100.00	14	3	9	2	8,205,512.07	22.05	**29,002,587.93**	**77.95**
- งบดำเนินงาน	29,208,100.00	13	3	8	2	6,932,407.00	23.73	**22,275,693.00**	**76.27**
- งบรายจ่ายอื่น	8,000,000.00	1	-	1	-	1,273,105.07	15.91	**6,726,894.93**	**84.09**

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	รวม	**218,895,300.00**	**29,563,216.19**	**189,332,084**	**13.51**	
	แขวงทางหลวงสมุทรสาคร	**49,964,884.00**	**8,486,941.77**	**41,477,942**	**16.99**	
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย **กิจกรรมย่อย :** งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3423 ตอน สมุทรสาคร - โคกขาม ระหว่าง กม. 3+400 – กม.4+800 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร	8,489,200	8,486,941.77	2,258	99.97	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
2	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย **กิจกรรมย่อย :** ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.28+000 - กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร	14,988,000	-	14,988,000	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 4/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 14,988,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 12,000 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 24.944** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 17.115**
3	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.21+500 – กม.27+500 ร่องแบ่งทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร	21,741,684	-	21,741,684	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 5/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 21,741,684 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 26,316 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 15.98** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 31.87**
4	**โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม. 27+000-กม.53+875 และทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม. 1+000 - กม.19+800 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	4,746,000	-	4,746,000	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท ธนัทธร จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 3/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 4,746,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 17,000 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 42** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 19.15**
	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	**55,248,200.00**	**3,702,653.36**	**51,545,546.64**	**6.70**	
5	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	7,836,000	-	7,836,000	-	**ผู้รับจ้าง :** หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา **เลขที่สัญญา :** สค 133/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 7,836,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 59,800 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 41.12** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 45**
6	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	5,090,000	-	5,090,000	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท สายรักไทย (1994) จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 132/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 5,090,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 10,000 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 61.76** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 60.96**
7	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	12,064,000	-	12,064,000	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 131/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 12,064,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 315,100 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ 35.5** **ผลการดำเนินงานร้อยละ 35**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
8	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.5029 แยกทางหลวงชนบท สค.3011 - บ้านลาดบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	4,142,000	-	4,142,000	-	**ผู้รับจ้าง :** หจก. ธวพลทราฟฟิค **เลขที่สัญญา :** สค 130/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 4,142,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 8,000 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** 60 **ผลการดำเนินงานร้อยละ** 70
9	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านโคกวัด (ตอนสมุทรสาคร) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	8,556,400	3,702,653.36	4,853,747	43.27	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 129/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 65 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 8,556,400 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 25,100 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** 41.23 **ผลการดำเนินงานร้อยละ** 40
10	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านอำแพง อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	1,700,000	-	1,700,000	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท เอ็น-เทค เทรดดิ้ง 2014 จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 208/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 1,700,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 540,000 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** - **ผลการดำเนินงานร้อยละ** -
11	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านรวมเจริญ - บ้านปากบ่อ ตำบลชัยมงคล อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โครงการสำรอง Y2	3,799,800	-	3,799,800	-	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท เอส.อาร์.เอสทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด **เลขที่สัญญา :** สค 207/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 3,799,800 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 1,800,200 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** - **ผลการดำเนินงานร้อยละ** -
12	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร **กิจกรรมย่อย** : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร	12,060,000	-	12,060,000	-	- อนุมัติโครงการ วันที่ 3 มีนาคม 2565 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 25 มีนาคม 2565 - กำหนดเสนอราคา วันที่ 31 มีนาคม 2565 - คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร	**45,860,306.59**	**9,168,108.99**	**36,692,198**	**19.99**	
13	**โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ บริเวณหนองนกไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.145 กิโลเมตร	4,365,747	1,545,475.05	2,820,272	35.40	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท ปาล์มคอน จำกัด **เลขที่สัญญา :** 116/2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 4,365,747 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 134,253 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** 9.75 **ผลการดำเนินงานร้อยละ** 65.80
14	**โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างทางเดินเท้า ความยาว 0.834 กิโลเมตร และศาลาพักผ่อน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	12,537,559.59	1,880,633.94	10,656,926	15.00	**ผู้รับจ้าง :** บริษัท ซี พี ที คอนกรีตอัดแรง จำกัด เลขที่สัญญา : 143/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 12,537,559.59 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 454,440.41 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** 6.02 **ผลการดำเนินงานร้อยละ** 14.64
15	**โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมดำ-คลองสหกรณ์สาย 3 พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดวิสุทธิวราวาส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.400 กิโลเมตร	19,800,000	5,742,000.00	14,058,000	29.00	**ผู้รับจ้าง :** หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง **เลขที่สัญญา :** 107/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 **วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง :** 19,800,000 บาท **มีเงินเหลือจ่าย :** 131,200 บาท **ผลการดำเนินงาน :** **แผนการดำเนินงานร้อยละ** 7 **ผลการดำเนินงานร้อยละ** 17.50

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
16	**โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.087 กิโลเมตร โครงการสำรอง Y2	9,157,000	-	9,157,000	-	- อนุมัติโครงการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 - อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาปลายเดือนเมษายน 2565
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ กรมทหารสื่อสารที่ 1	**6,578,800.00**	**-**	**6,578,800**	**-**	
17	**โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **กิจกรรมย่อย :** พัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	6,578,800	-	6,578,800	-	- อนุมัติโครงการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 - อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาปลายเดือนเมษายน 2565
	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	**19,569,800.00**	**100,000.00**	**19,469,800**	**0.51**	
18	**โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	19,469,800	-	19,469,800	-	- อนุมัติโครงการ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 - อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
19	**โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย** **กิจกรรมหลัก :** สืบชะตาทะเล โครงการสำรอง Y2	100,000	100,000.00	-	100.00	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	**6,656,500.00**	**12,600.00**	**6,643,900**	**0.19**	
20	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาระบบการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล	4,442,000	12,600	4,429,400	0.28	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 : จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ	2,400,300	12,600.00	2,387,700		กำหนดจัดงานสมุทรสาคร On Tour On Sale ครั้งที่ 1 : 17-21 มี.ค. 65 ณ โรบินสันศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี - จัดงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 30 มี.ค - 3 เม.ย. 65 ณ ตลาดบางลำพู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 : 20-24 เม.ย. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
	กิจกรรมย่อยที่ 2 : จัดกิจกรรมแถลงข่าวและจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (เบญจรงค์)	500,000	-	500,000		- กำหนดจัดงานสืบสานสีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มี.ค. 65 ณ หมู่บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน - จัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
	กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,017,700	-	1,017,700		- จัดงานเทศกาลลำไยและเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 65 ณ CentralPlaza Mahachai - จัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา - กำหนดจัดงานการจัดงาน Mahachai Coconut Festival 2022 ระหว่างวันที่ 22-31 ก.ค. 65 ณ CentralPlaza Mahachai
	กิจกรรมย่อยที่ 4 : ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และประชาสัมพันธ์/ตรวจสอบคุณภาพผู้ขอใช้ตรา GI จังหวัดสมุทรสาคร	24,000	-	24,000		
	กิจกรรมย่อยที่ 5 : ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน	500,000	-	500,000		- กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ณ พอโตชิโน หรือ Central Plaza Mahachai ครั้งที่ 1 : 25-27 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 : 1-3 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3 : 8-10 เมษายน 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
21	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล	1,214,500	-	1,214,500	-	กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาคร (Business Matching) ครั้งที่ 1 : 4-11 พ.ค. 65 ณ จ.ระนอง/สงขลา/นราธิวาส ครั้งที่ 2 : 23-30 พ.ค. 65 ณ จ.กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี/ชัยนาท ครั้งที่ 3 : 22-29 มิ.ย. 65 ณ จ.นครราชสีมา/ขอนแก่น/อุดรธานี ครั้งที่ 4 : 21-31 ส.ค. 65 ณ จ.ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด
22	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** โครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน ตลอดสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนและช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	1,000,000	-	1,000,000	-	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	**5,857,400.00**	**879,667.00**	**4,977,733**	**15.02**	
23	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน** **กิจกรรมหลัก** รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2565	5,857,400	879,667.00	4,977,733	15.02	- อยู่ระหว่างการประกวดตามกำหนดการของส่วนกลาง
	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	**4,561,000.00**	**4,561,000.00**	**-**	**100.00**	
24	**โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย** **กิจกรรมหลัก** ส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น / ชุมชน จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน “ตรุษจีน "เล่ง เกีย ฉู่" สืบสานตำนานมังกร 2565”	4,561,000	4,561,000.00	-	100.00	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	**2,425,900.00**	**126,800.00**	**2,299,100**	**5.23**	
25	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	2,425,900	126,800.00	2,299,100	5.23	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งกำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 25 มีนาคม 2565
	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	**2,865,000.00**	**691,000.00**	**2,174,000**	**24.12**	
26	**โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว** **กิจกรรมหลัก :** ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว One day Trip	2,865,000	691,000.00	2,174,000	24.12	- กำหนดจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวสมุทรสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ 10 ครั้ง ระว่างวันที่ 26 ก.พ. 65 - 27 มี.ค. 65 - จัดไปแล้ว 8 ครั้ง - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ในห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร	**9,540.00**	**9,540.00**	**-**	**100.00**	
27	**โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร	9,540	9,540.00	-	100.00	- แจ้งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5 ของจังหวัดสมุทรสาครที่วัดโดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่บริเวณแขวงการทางสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบนและโรงเรียนสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ในช่วงที่ผ่านมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ
	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร	**1,397,500.00**	**551,800.00**	**845,700**	**39.48**	
28	**โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ** **กิจกรรมหลัก :** การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	898,800	422,600.00	476,200	47.02	- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 5 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 เดือน พ.ย. 65 ครั้งที่ 3-5 เดือน ธ.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและการพัฒนาคุณภาพน้ำทิ้งให้ผ่านค่ามาตรฐาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างลงพื้นที่ในแต่ละสถานประกอบการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
29	**โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ** **กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 หรือสูงกว่า	498,700	129,200.00	369,500	25.91	- จัดอบรมสัมนาโครงการ ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 65 ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแต่ละสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการแต่ละราย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างลงพื้นที่ในแต่ละสถานประกอบการ
	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	**12,040,000.00**	**1,273,105.07**	**10,766,895**	**10.57**	
30	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	1,273,105.07	6,726,895	15.91	
31	**โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** บูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการสำรอง Y2	2,840,000	-	2,840,000	-	**- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร**
32	**โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** **กิจกรรมหลัก :** ขับเคลื่อนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการสำรอง Y2	1,200,000	-	1,200,000	-	**- อนุมัติโครงการ วันที่ 27 มกราคม 2565**
	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง	**4,839,469.41**				
	เงินยกเลิกโครงการ/กิจกรรม	**1,021,000.00**				

พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

๙. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รวม ๗,๐๓๖,๐๐๐ บาท คือ
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ๕,๓๒๙,๔๐๐ บาท
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม ๔๒๖,๘๐๐ บาท
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม ๑,๒๗๙,๘๐๐ บาท

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๗,๔๑๑,๐๑๒,๓๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวม ๑,๕๓๗,๑๗๐,๓๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๔๖๔,๒๕๖,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ๔๖๔,๒๕๖,๔๐๐ บาท
(๒) จังหวัดชัยนาท ๒๐๖,๒๖๒,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ๒๐๖,๒๖๒,๔๐๐ บาท
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ๒๔๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท
(๔) จังหวัดลพบุรี ๑๙๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ๑๙๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท

(๔) จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๓๔,๗๘๖,๖๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๔,๗๘๖,๖๐๐ บาท
(๕) จังหวัดสมุทรสาคร ๒๑๘,๘๙๕,๓๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๑๘,๘๙๕,๓๐๐ บาท

๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๑,๐๘๘,๘๒๓,๓๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๒๓๙,๐๒๕,๓๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๓๙,๐๒๕,๓๐๐ บาท
(๒) จังหวัดชุมพร ๑๒๗,๐๔๕,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๗,๐๔๕,๔๐๐ บาท
(๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๖๒,๐๗๙,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๖๒,๐๗๙,๔๐๐ บาท
