รายงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

จังหวัดสมุทรสาคร
SAMUTSAKHON



0 3442 5075

strategy.skn@gmail.com

http://www.samutsakhon.go.th

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)




1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10 โครงการ 12 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 210,566,900 บาท (สองร้อยสิบล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

1.1 สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ผลผลิต

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนสู่เมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง จากฐานการอุตสาหกรรม การเกษตร และการประมง แบบครบวงจร การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน (High Value Economy City)		**35,447,400**	**16.84**
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		**2,947,400**	
1	โครงการยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหารและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	830,400	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	2,117,000	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		**32,500,000**	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	32,500,000	
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Development City)		**69,810,700**	**33.15**
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**69,810,700**	
4	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	67,790,000	
5	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	1,007,500	
6	โครงการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1,013,200	
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา และชุมชน เข้มแข็ง (Well-Being City)		**105,308,800**	**50.01**
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		**105,308,800**	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน	5,989,800	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	86,637,000	
9	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4,712,000	
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	8,000,000	

1.2 สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

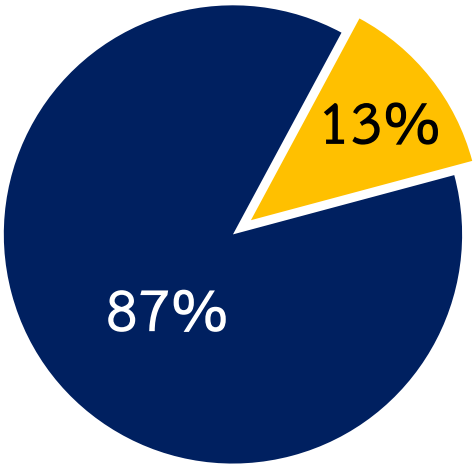

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

210,566,900 บาท

รายจ่ายลงทุน	186,027,000 บาท
รายจ่ายประจำ	24,539,900 บาท

2. กลไกการกำกับติดตาม



1. คณะกรมการจังหวัด
2. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.สค.)
4. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสาคร


3. การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 คณะกรมการจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน



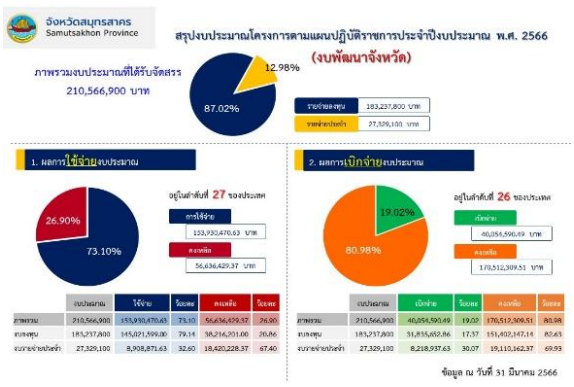

3.2 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการฯ และการบริหารงบประมาณในภาพรวม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ








3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.สค.)

นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (นอกรอบ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมฯ และร่วมลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร





3.4 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ กรณีส่วนราชการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



3.5 คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ 3 อำเภอ



4. ผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พ.ศ. 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 100.00 จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม (ร้อยละ)		ไตรมาส 1 (ร้อยละ)		ไตรมาส 2 (ร้อยละ)		ไตรมาส 3 (ร้อยละ)		ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93.00	100	32.00	34.08	20.00	22.16	23.00	25.50	18.00	18.26
งบลงทุน	75.00	100	19.00	28.96	20.00	29.19	18.00	23.50	18.00	18.35
งบรายจ่ายประจำ	98.00	100	35.00	35.33	20.00	20.45	25.00	25.98	18.00	18.24


อ้างอิงจาก หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565

4.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

จังหวัดสมุทรสาครได้ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 66

อยู่ในลำดับที่ 26 ของประเทศ

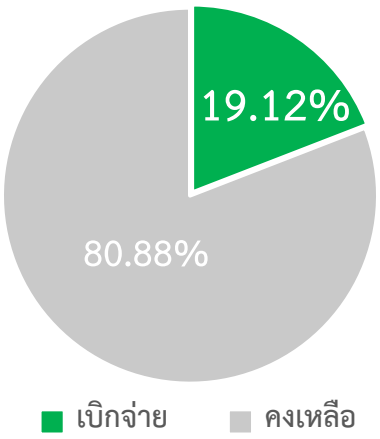

ภาพรวม

การเบิกจ่าย 19.02%

19.02% | 80.98%

40,054,590.49 บาท

การใช้จ่าย 73.10%

73.10% | 26.90%

153,930,470.63 บาท

งบลงทุน

การเบิกจ่าย 17.37%

17.37% | 82.63%

31,835,652.86 บาท

การใช้จ่าย 79.14%

79.14% | 20.86%

145,021,599.00 บาท

งบรายจ่ายประจำ

การเบิกจ่าย 30.07%

30.07% | 69.93%

8,218,937.63 บาท

การใช้จ่าย 32.60%

32.60% | 67.40%

8,908,871.63 บาท

เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(รายโครงการ)

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 28 รายการ งบประมาณ 210,566,900 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

รายการ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	จำนวน (รายการ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่ายงบประมาณ			
			อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อหนี้แล้ว/ดำเนินการ	ดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวมทั้งหมด	**210,566,900.00**	**28**	**4**	**2**	**21**	**1**	**40,054,590.49**	**19.02**	**170,512,309.51**	**80.98**
งบลงทุน	**183,237,800.00**	**15**	**1**	**1**	**13**	**-**	**31,835,652.86**	**17.37**	**151,402,147.14**	**82.63**
งบรายจ่ายประจำ	**27,329,100.00**	**13**	**3**	**1**	**8**	**1**	**8,218,937.63**	**30.07**	**19,110,162.37**	**69.93**
- งบดำเนินงาน	19,329,100.00	12	3	1	7	1	5,539,424.21	28.66	13,789,675.79	71.34
- งบรายจ่ายอื่น	8,000,000.00	1	-	-	1	-	2,679,513.42	33.49	5,320,486.58	66.51

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร (ประเภทงบลงทุน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย ตามสัญญา	ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร	63,590,800.00	63,551,399.00	39,401.00	63,551,399.00	99.94	18,030,757.61	28.35	
1	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตำเนินสะดวก พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 225.00 เมตร	33,234,900.00	33,195,499.00	39,401.00	33,195,499.00	99.88	13,477,372.61	40.55	- คู่สัญญา : หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง (#114/2566) - ลงนามสัญญา : 14 ธ.ค. 65 - สิ้นสุดสัญญา : 11 ส.ค. 66 - จำนวน 35 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน - แผน 31.21% / ผล 57.05% เร็วกว่าแผน +25.84% - หล่อคอนกรีตแผงกรุ ค.ส.ล. - ติดตั้งแผงกรุ ค.ส.ล. - ผูกเหล็กคาน GB1 , GB2 , B1 , B2 - ผูกเหล็กพื้น S1 - เทคอนกรีตคาน GB1 , GB2 , B1 , B2 และ พื้น S1 - ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ - ถมทราย - ทิ้งหินใหญ่
2	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง **กิจกรรมย่อย :** ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 200.00 เมตร	30,355,900.00	30,355,900.00	-	30,355,900.00	100.00	4,553,385.00	15.00	- คู่สัญญา : หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง (#120/2565) - ลงนามสัญญา : 21 ธ.ค. 65 - สิ้นสุดสัญญา : 18 ส.ค. 66 - จำนวน 35 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน - แผน 13.5% / ผล 0.5% ช้ากว่าแผน -13% - ระหว่างตั้งนั่งร้านเพื่อตอกเสาเข็ม
	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	119,647,000.00	119,570,200.00	76,800.00	81,470,200.00	72.00	13,804,895.25	12.20	
3	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านสหกรณ์ หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 81 ต้น	4,625,000.00	4,625,000.00	-	4,625,000.00	100.00	693,750.00	15.00	- คู่สัญญา : บ.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (#127/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 66 - จำนวน 5 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 - ผลการดำเนินงาน = 50% - อยู่ในระหว่างการติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า,สายไฟฟ้า
4	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกาหลง - บ้านชายทะเลกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 151 ต้น	9,569,000.00	9,569,000.00	-	9,569,000.00	100.00	-	-	- คู่สัญญา : บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 66 - จำนวน 6 งวดงาน ผลการดำเนินงาน = 50% - อยู่ในระหว่างการติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า และลงเสาไฟฟ้า
5	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกระช้าขาว-บ้านนาเกลือมณีรัตน์ ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 169 ต้น	10,540,000.00	10,540,000.00	-	10,540,000.00	100.00	1,581,000.00	15.00	- คู่สัญญา : บริษัท พงศกลการ จำกัด (#132/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 66 - จำนวน 6 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน = 70% - อยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
6	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านดอนไก่ดี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง และตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 176 ต้น	9,922,000.00	9,922,000.00	-	9,922,000.00	100.00	1,488,300.00	15.00	- คู่สัญญา : บ.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (#126/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 66 - จำนวน 6 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน = 70% - อยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
7	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านท่าเสา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 148 ต้น	9,396,000.00	9,396,000.00	-	9,396,000.00	100.00	-	-	- คู่สัญญา : บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 66 - จำนวน 6 งวดงาน ผลการดำเนินงาน = 50% - อยู่ระหว่างการติดตั้งฐานเสาและเสาไฟฟ้า - รอผลทดสอบโคม LED จาก กฟน.
8	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบางสีคต - บ้านชายทะเลกระช้าขาว ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 61 ต้น	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	100.00	600,000.00	15.00	- คู่สัญญา : บริษัท ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด (#128/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 13 เม.ย. 66 - จำนวน 3 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน = 95% - อยู่ระหว่างการติดตั้งฐาน,เสาไฟฟ้า,สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณตามสัญญา	เงินเหลือจ่ายตามสัญญา	ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
9	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 34 ต้น	2,153,000.00	2,153,000.00	-	2,153,000.00	100.00	322,950.00	15.00	- คู่สัญญา : บริษัท ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด (#129/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 3 เม.ย. 66 - จำนวน 3 งวดงาน - เบิกค่าจ้างล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ผลการดำเนินงาน = 100% - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
10	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจีน ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 64 ต้น	4,115,000.00	4,115,000.00	-	4,115,000.00	100.00	617,250.00	15.00	- คู่สัญญา : หจก.ชุ่มจิตเพาเวอร์ (#133/2566) - ลงนามสัญญา : 3 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 14 เม.ย. 66 - จำนวน 3 งวดงาน ผลการดำเนินงาน = 85% - อยู่ระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
11	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพ้ว ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 126 ต้น	4,782,600.00	4,705,800.00	76,800.00	4,705,800.00	98.39	-	-	- คู่สัญญา : บจก.สายรักไทย (1994) (#146/2566) - ลงนามสัญญา : 30 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 29 มิ.ย. 66 - จำนวน 5 งวดงาน ผลการดำเนินงาน = 10% - อยู่ในระหว่างการหล่อฐานเสา
12	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 9 บ้านศรีพิพัฒน์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 37 ต้น	1,384,400.00	1,384,400.00	-	1,384,400.00	100.00	-	-	- คู่สัญญา : บจก.สายรักไทย (1994) (#147/2566) - ลงนามสัญญา : 30 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 66 - จำนวน 3 งวดงาน ผลการดำเนินงาน = 10% - อยู่ในระหว่างการหล่อฐานเสา
13	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน **กิจกรรมย่อย :** ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 - นิคมบ้านไร่ ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 18.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	21,060,000.00	21,060,000.00	-	21,060,000.00	100.00	8,501,645.25	40.37	- คู่สัญญา : บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 (#137/2566) - ลงนามสัญญา : 12 ม.ค. 66 - สิ้นสุดสัญญา : 26 มิ.ย. 66 - จำนวน 11 งวดงาน - ตรวจรับงวดที่ 1-4 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 ผลการดำเนินงาน = 94% - อยู่ในระหว่างการตีเส้นและติดมุดสะท้อนแสง
14	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน **กิจกรรมย่อย :** ปรับปรุงถนนสาย หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก ถึง หมู่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการสำรอง Y2)	31,600,000.00	31,600,000.00		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 - กำหนดเสนอราคา วันที่ 23 มี.ค. 66 คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน 19 เม.ย. 66 - ระยะเวลาดำเนินโครงการ 150 วัน (ไม่เกิน ก.ย. 66)
15	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน** **กิจกรรมหลัก :** โครงการงานอำนวยความปลอดภัย **กิจกรรมย่อย :** ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา ถึง หมู่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 104 ต้น (โครงการสำรอง Y2)	6,500,000.00	6,500,000.00		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - ก.บ.จ.สค. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
	รวม	183,237,800.00	183,121,599.00	116,201.00	145,021,599.00	82.05	31,835,652.86	18.01	

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสาคร (ประเภทงบรายจ่ายประจำ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่ายตามสัญญา	ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		หมายเหตุ
				งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร	**830,400**		**247,739.96**	**29.83**	**247,739.96**	**29.83**	
1	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหารและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต	830,400		**247,739.96**	**29.83**	**247,739.96**	**29.83**	ผลการดำเนินงาน - อบรมรุ่นที่ 1 หลักสูตรช่างเชื่อม 19-23 ธ.ค 65 หลักสูตรชั้นสูง 23 -27 ธ.ค. 65 - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมครั้งถัดไป ในช่วงไตรมาสที่ 3-4
	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร	**1,013,200**		**143,850.00**	**14.20**	**143,850.00**	**14.20**	
2	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ** **กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 หรือสูงกว่า	498,400		**106,400.00**	**21.35**	**106,400.00**	**21.35**	ผลการดำเนินงาน - กำหนดดำเนินการ มี.ค.-เม.ย. 66 เนื่องจากมีการปรับกลุ่มเป้าหมาย
3	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ** **กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	514,800		**37,450.00**	**7.27**	**37,450.00**	**7.27**	ผลการดำเนินงาน - กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 66
	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร	**1,007,500**		**4,775.00**	**0.47**	**4,775.00**	**0.47**	
4	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม** **กิจกรรมหลัก :** ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร	1,007,500		4,775.00	0.47	4,775.00	0.47	ผลการดำเนินงาน - ติดตามสถานการณ์ PM2.5 จนถึงกลางเดือน ก.พ. 66
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	**2,117,000**		**117,000.00**	**5.53**	**117,000.00**	**5.53**	
5	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชน	2,117,000		**117,000.00**	**5.53**	**117,000.00**	**5.53**	ผลการดำเนินงาน - กิจกรรมย่อยที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเสนอราคา 16 มี.ค. 66 คาดว่าจะลงนาม สิ้นเดือน มี.ค. 66 - สัญญาดำเนินกิจกรรม 10 เดือน
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	**5,959,800**		**902,059.25**	**15.14**	**760,059.25**	**12.75**	
6	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน** **กิจกรรมหลัก :** รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร	5,959,800		**902,059.25**	**15.14**	**760,059.25**	**12.75**	ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม
	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	**4,266,000**	**-**	**4,266,000.00**	**100.00**	**4,266,000.00**	**100.00**	
7	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** **กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชนจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร”	4,266,000		4,266,000.00	100.00	4,266,000.00	100.00	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เงินเหลือจ่ายตามสัญญา	ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 66		หมายเหตุ
				งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	**1,638,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
8	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรมแถลงข่าว และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (เบญจรงค์) ณ หมู่บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการสำรอง Y2)	500,000		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - สงป. แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 - อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 - กำหนดจัดงานสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. 66
9	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล **กิจกรรมย่อย :** จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) (โครงการสำรอง Y2)	1,138,200		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - ก.บ.จ.สค. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8	**1,197,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	
10	**ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** **กิจกรรมหลัก :** อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม (โครงการสำรอง Y2)	1,197,000	-	-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - ก.บ.จ.สค. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	**9,300,000**	**-**	**3,227,447.42**	**38.42**	**2,679,513.42**	**31.90**	
11	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	8,000,000		3,227,447.42	40.34	2,679,513.42	33.49	
12	**ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ** **กิจกรรมหลัก :** บูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก **กิจกรรมย่อย :** จัดงานเทศกาลปลาทู (โครงการสำรอง Y2)	400,000		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - สงป. แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 - อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 - กำหนดจัดงาน 31 มี.ค.-4 เม.ย. 66
13	**ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** **โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** **กิจกรรมหลัก :** ขับเคลื่อนการขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ **กิจกรรมย่อย :** ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการสำรอง Y2)	900,000		-	-	-	-	ผลการดำเนินงาน - ก.บ.จ.สค. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
	รวม	**27,329,100**	**-**	**8,908,871.63**	**35.31**	**8,218,937.63**	**32.57**	

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๑,๕๐๐,๖๔๑,๔๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวม ๑,๔๖๓,๗๒๘,๒๐๐ บาท คือ

(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๓๗๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓๗๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท

(๒) จังหวัดชัยนาท ๑๙๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๙๓,๐๖๓,๙๐๐ บาท

(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๒๔,๑๔๕,๓๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๒๔,๑๔๕,๓๐๐ บาท

(๔) จังหวัดลพบุรี ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท

(๕) จังหวัดสระบุรี ๑๗๖,๑๖๙,๐๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๖,๑๖๙,๐๐๐ บาท

(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๓๒,๔๖๙,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๓๒,๔๖๙,๙๐๐ บาท

๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๒ รวม ๙๑๒,๔๕๒,๐๐๐ บาท คือ
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๒๒๗,๗๖๑,๙๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๒๒๗,๗๖๑,๙๐๐ บาท
(๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๖๙,๗๐๖,๖๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๖๙,๗๐๖,๖๐๐ บาท
(๓) จังหวัดเพชรบุรี ๑๗๖,๑๘๘,๔๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๗๖,๑๘๘,๔๐๐ บาท
(๔) จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๒๘,๒๒๘,๒๐๐ บาท
(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒๘,๒๒๘,๒๐๐ บาท
(๕) จังหวัดสมุทรสาคร ๒๑๐,๕๖๖,๙๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ๒๑๐,๕๖๖,๙๐๐ บาท

๕. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม ๑,๔๗๗,๐๓๖,๒๐๐ บาท คือ

(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๓๔๔,๒๐๙,๙๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ๓๔๔,๒๐๙,๙๐๐ บาท

(๒) จังหวัดชุมพร ๑๗๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ๑๗๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท

(๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๙,๑๕๖,๑๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ๒๕๙,๑๕๖,๑๐๐ บาท

(๔) จังหวัดพัทลุง ๒๑๕,๒๔๓,๐๐๐ บาท

(ก) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ๒๑๕,๒๔๓,๐๐๐ บาท

(๕) จังหวัดสงขลา ๒๕๗,๙๓๓,๗๐๐ บาท
